

CONSTANCIA DE RECORRIDO E INSPECCIÓN PREVIO A FIRMA AL ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA

Contrato Nro. 001-AZMS-2022
Procedimiento Nro. MCO-AZC-01-2022

FECHA : Jueves 02 de marzo de 2023

HORA: 10h00

ANTECEDENTES:

Mediante oficio No 10 inserto en trámite SITRA Nro. AZMS-DAF-SAC-2023-0407-E de 24 de febrero de 2023, el contratista Ing. Pedro Alajo solicita se proceda a realizar le RECEPCION DEFINITIVA de la obra del contrato.

Con Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-2022-0627-M de fecha 5 de septiembre de 2022, la Ing. Cristina Reyes Merino Administradora Zonal indica "por medio de la presente me permito designar a Usted, Ing. Guido Patricio Andrade Almache, analista de fiscalización de esta Administración Zonal, debido a la necesidad institucional para ser Administrador de las obras del proceso de Menor Cuantía MCO-AZC- 001-2022, mismo que corresponde a una (1) obra del programa de infraestructura Comunitaria."

Con Oficio Nro. GADDMQ-AZMS-DGC-OP-2023-0002-O, de 28 de febrero de 2023, el Ing. Patricio Andrade Almache Administrador del contrato, informa que el recorrido para la recepción definitiva de la obra se lo realizará el día jueves 02 de marzo de 2023 a las 10H00 en el inicio de la Calle Aguarico.

OBSERVACIONES:

En el recorrido realizado NO se encontraron novedades,por tal motivo se procede a la recepción definitiva de la obra.

READOQUINADO DE LA CALLE AGUARICO, DESDE LA CALLE 10 DE OCTUBRE SENTIDO DESCENDENTE, BARRIO LA LIBERTAD ALTO, PARROQUIA LA LIBERTAD

SIN NOVEDADES






Vía emporada



Pintura en Bordillos

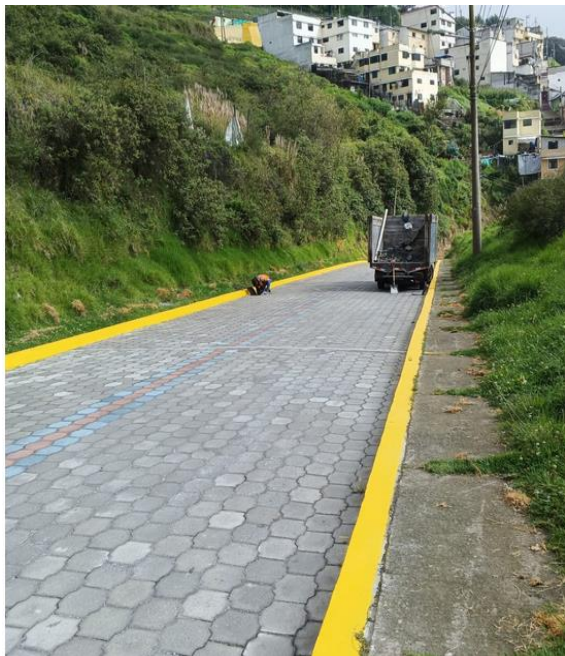

OBSERVACIONES:

Una vez realizada la inspección, se recibe las obras sin novedades

CONTRATISTA

Ing. Pedro Javier Alajo Guevara

JEFA DE FISCALIZACIÓN AZMS (observador)

Arq. María de los Ángeles Elizalde Vega

ADMINISTRADOR DEL PROCESO AZMS

Ing. Guido Patricio Andrade Almache

TECNICO DELEGADO NO PARTICIPANTE AZMS

Arq. Henry Fabricio Alba Abad

CONSTANCIA DE RECORRIDO E INSPECCIÓN PREVIO A FIRMA AL ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA

MCO-AZC-003-2022


FECHA : Viernes 10 de marzo del 2023

HORA: 10h00

ANTECEDENTES: Mediante documento **ZMS-DAF-SAC-2023-0415-E** de fecha 27 de febrero de 2023, el contratista adjudicado del proceso MCO-AZC-003-2022 para la obra: **"4 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS PARROQUIAS DE SAN JUAN SECTORES CIUDADELA AMAZONAS MIRAFLORES ALTO LA BASILICA Y TOCTIUCO AZCE"** "REHABILITACIÓN ESCALINATA DEL PASAJE CUEVA, DESDE JOSÉ YEPEZ HASTA CONDORCUNGA, CIUDADELA AMAZONAS, SECTOR SAN JUAN"; "CONSTRUCCION ESCALINATA PASAJE CANCHAGUA, TRAMO CALLE ANTONIO VILLAVICENCIO Y PABLO GUTIERREZ, BARRIO MIRAFLORES ALTO, SECTOR SAN JUAN"; "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE Oe16E , BARRIO PAVON GRIJALVA, PARROQUIA SAN JUAN"; "CONSTRUCCION CERRAMIENTO PARQUE JUAN DE VILLA, ENTRE ESCALINATA JUAN DE VILLA Y PASAJE S/N, BARRIO TOCTIUCO ALTO, SECTOR SAN JUAN", "El día 10 de marzo de 2022 se realizó la primera inspección, en donde se encontraron algunas observaciones de forma y se estableció fecha para la nueva inspección.

OBSERVACIONES:

REHABILITACIÓN ESCALINATA DEL PASAJE CUEVA, DESDE JOSÉ YEPEZ HASTA CONDORCUNGA, CIUDADELA AMAZONAS, SECTOR SAN JUAN

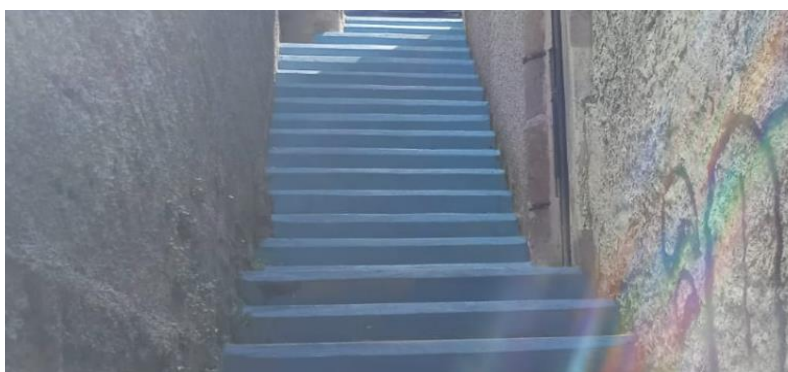

Se deben subsanar las observaciones planteadas en el recorrido de obra, como son fisuras, filos de gradas, pintura y limpieza

CONSTRUCCION ESCALINATA PASAJE CANCHAGUA, TRAMO CALLE ANTONIO VILLAVICENCIO Y PABLO GUTIERREZ, BARRIO MIRAFLORES ALTO, SECTOR SAN JUAN



Se debe subsanar fisuras en los gradas, limpieza de la escalinata y pintura.

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE Oe16E , BARRIO PAVON GRIJALVA, PARROQUIA SAN JUAN



SIN NOVEDADES

CONSTRUCCION CERRAMIENTO PARQUE JUAN DE VILLA, ENTRE ESCALINATA JUAN DE VILLA Y PASAJE S/N, BARRIO TOCTIUCO ALTO, SECTOR SAN JUAN



SIN NOVEDADES

OBSERVACIONES: Una vez realizada la inspección, se deben subsanar las correcciones antes descritas para programar una próxima inspección.

CONTRATISTA
Ing. Santiago Cáceres

ADMINISTRADOR DEL PROCESO AZMS
Ing. Cristian Llamuca LI.

TECNICO NO INTERVINIENTE
Ing. José García



CONSTANCIA DE RECORRIDO E INSPECCIÓN PREVIO A FIRMA AL ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA

MCO-AZC-003-2022


FECHA : Miercoles 22 de marzo del 2023

HORA: 11h00

ANTECEDENTES: Mediante documento **ZMS-DAF-SAC-2023-0415-E** de fecha 27 de febrero de 2023, el contratista adjudicado del proceso MCO-AZC-003-2022 para la obra: **"4 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS PARROQUIAS DE SAN JUAN SECTORES CIUDADELA AMAZONAS MIRAFLORES ALTO LA BASILICA Y TOCTIUCO AZCE"** "REHABILITACIÓN ESCALINATA DEL PASAJE CUEVA, DESDE JOSÉ YEPEZ HASTA CONDORCUNGA, CIUDADELA AMAZONAS, SECTOR SAN JUAN"; "CONSTRUCCION ESCALINATA PASAJE CANCHAGUA, TRAMO CALLE ANTONIO VILLAVICENCIO Y PABLO GUTIERREZ, BARRIO MIRAFLORES ALTO, SECTOR SAN JUAN"; "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE Oe16E , BARRIO PAVON GRIJALVA, PARROQUIA SAN JUAN"; "CONSTRUCCION CERRAMIENTO PARQUE JUAN DE VILLA, ENTRE ESCALINATA JUAN DE VILLA Y PASAJE S/N, BARRIO TOCTIUCO ALTO, SECTOR SAN JUAN", "El día 22 de marzo de 2023 se realizó la segunda inspección, en donde no se encontraron observaciones y se recibe la obra de manera definitiva.

OBSERVACIONES:

REHABILITACIÓN ESCALINATA DEL PASAJE CUEVA, DESDE JOSÉ YEPEZ HASTA CONDORCUNGA, CIUDADELA AMAZONAS, SECTOR SAN JUAN

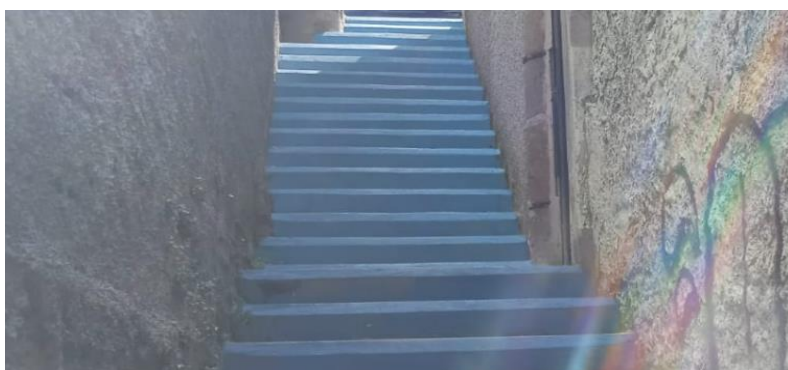

SIN NOVEDADES

CONSTRUCCION ESCALINATA PASAJE CANCHAGUA, TRAMO CALLE ANTONIO VILLAVICENCIO Y PABLO GUTIERREZ, BARRIO MIRAFLORES ALTO, SECTOR SAN JUAN



SIN NOVEDADES

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE Oe16E , BARRIO PAVON GRIJALVA, PARROQUIA SAN JUAN



SIN NOVEDADES

CONSTRUCCION CERRAMIENTO PARQUE JUAN DE VILLA, ENTRE ESCALINATA JUAN DE VILLA Y PASAJE S/N, BARRIO TOCTIUCO ALTO, SECTOR SAN JUAN



SIN NOVEDADES

OBSERVACIONES: Se recibe las obras sin observaciones.

CONTRATISTA
Ing. Santiago Cáceres

ADMINISTRADOR DEL PROCESO AZMS
Ing. Cristian Llamuca Ll.
AZMS

TECNICO NO INTERVINIENTE
Ing. José García
AZMS

OBSERVADOR
Arq. María de los Ángeles Elizalde
JEFA DE FISCALIZACIÓN AZMS

CONSTANCIA DEL RECORRIDO E INSPECCIÓN PREVIO A FIRMA AL ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA

MCO-AZC-004-2022


FECHA : Viernes 10 de marzo del 2023

HORA: 14h00

ANTECEDENTES: Mediante documento **AZMS-DAF-SAC-2023-0411-E** de fecha 24 de febrero de 2023, ingresa el oficio para la recepción definitiva el contratista adjudicado del proceso MCO-AZC-004-2022 para la obra: " **6 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PARROQUIAS DEL CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN SECTORES BALCON COLONIAL EL PLACER TOCTIUCO 2 LOMA GRANDE Y SAN DIEGO**" "READOQUINADO PASAJE MANUEL J. CALLE, BARRIO LA LOMA GRANDE, SECTOR CENTRO HISTORICO"; " REHABILITACIÓN DE LA CALLE BARAHONA, BARRIO CENTRO HISTÓRICO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO" ; " READOQUINADO DE LA PROLONGACION DE LA CALLE MEJIA, HASTA PASAJE OE11D, BARRIO BALCON COLONIAL" ; " READOQUINADO DE LA CALLE EL PLACER DESDE ANDRÉS DE ZÚÑIGA HASTA CALLE BAÑOS, BARRIO EL PLACER, PARROQUIA SAN JUAN" SECTOR SAN JUAN" ; "READOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JUAN DE VILLA (DESDE JUAN DE QUIROZ HASTA JERÓNIMO PUENTE), BARRIO TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN" ; " ADOQUINADO DE LA CALLE JERÓNIMO PUENTE (PROLONGACIÓN), DESDE JERÓNIMO PUENTE, HASTA RAMÍREZ DE ARELLANO, BARRIO PAVÓN GRIJALVA, PARROQUIA SAN JUAN" El día 07 de marzo de 2023 se realizó la primera inspección, en donde se encontraron algunas observaciones por lo cual el con tratista solicito tres dias para subsanarlos por lo que se realizara un nuevo recorrido el viernes 10 de marzo de 2023 a las 14h00 para la nueva inspección.


OBSERVACIONES:

READOQUINADO PASAJE MANUEL J. CALLE, BARRIO LA LOMA GRANDE, SECTOR CENTRO HISTORICO

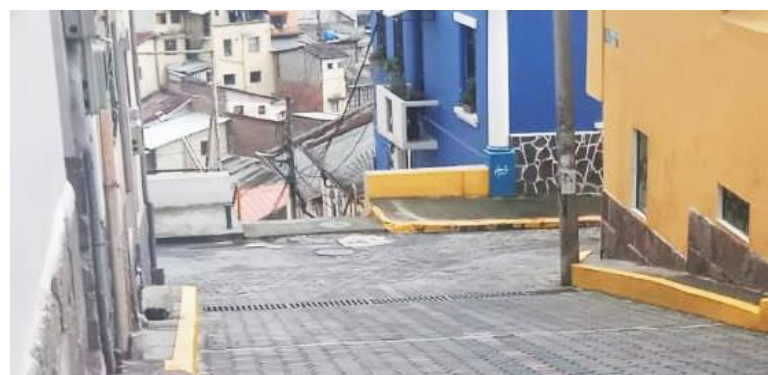

SIN NOVEDADES

REHABILITACIÓN DE LA CALLE BARAHONA, BARRIO CENTRO HISTÓRICO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO

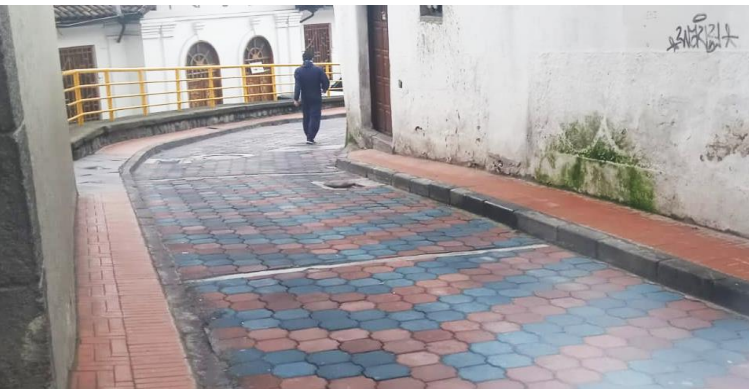

SIN NOVEDADES

READOQUINADO DE LA PROLONGACION DE LA CALLE MEJIA, HASTA PASAJE OE11D, BARRIO BALCON COLONIAL



SIN NOVEDADES

READOQUINADO DE LA CALLE EL PLACER DESDE ANDRÉS DE ZÚÑIGA HASTA CALLE BAÑOS, BARRIO EL PLACER, PARROQUIA SAN JUAN" SECTOR SAN JUAN




SIN NOVEDADES

READOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JUAN DE VILLA (DESDE JUAN DE QUIROZ HASTA JERÓNIMO PUENTE), BARRIO TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN



SIN NOVEDADES

DOQUINADO DE LA CALLE JERÓNIMO PUENTE (PROLONGACIÓN), DESDE JERÓNIMO PUENTE, HASTA RAMÍREZ DE ARELLANO, BARRIO PAVÓN GRIJALVA, PARROQUIA SAN JUAN

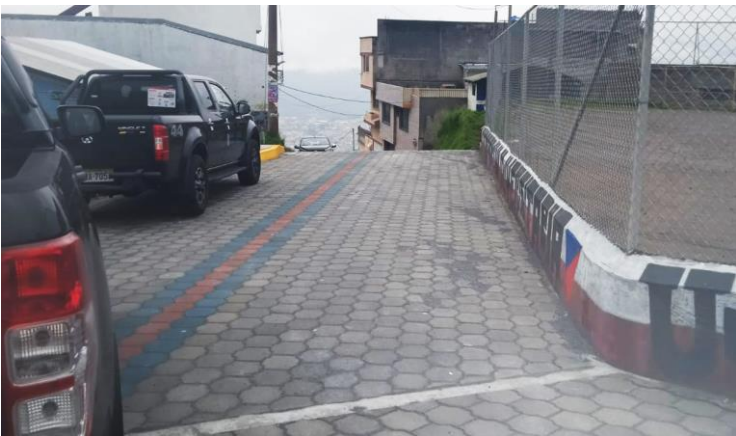

SIN NOVEDADES

OBSERVACIONES: Se recibe las obras sin observaciones

CONTRATISTA
Ing. Erick Aguilar

ADMINISTRADOR DEL PROCESO AZMS
Ing. Cristian Javier Llamuca Llamuca
AZMS

TECNICO NO INTERVINIENTE
Arq. Henry Alba
AZMS

FISCALIZADOR
Ing. Erick García
AZMS



CONSTANCIA DE RECORRIDO E INSPECCIÓN PREVIO A FIRMA AL ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA

MCO-AZC-004-2022



FECHA : Martes 07 de marzo del 2023

HORA: 12h00

ANTECEDENTES: Mediante documento **AZMS-DAF-SAC-2023-0411-E** de fecha 24 de febrero de 2023, ingresa el oficio para la recepción definitiva el contratista adjudicado del proceso MCO-AZC-004-2022 para la obra: " **6 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PARROQUIAS DEL CENTRO HISTORICO Y SAN JUAN SECTORES BALCON COLONIAL EL PLACER TOCTIUCO 2 LOMA GRANDE Y SAN DIEGO**" "READOQUINADO PASAJE MANUEL J. CALLE, BARRIO LA LOMA GRANDE, SECTOR CENTRO HISTORICO"; " REHABILITACIÓN DE LA CALLE BARAHONA, BARRIO CENTRO HISTÓRICO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO"; " READOQUINADO DE LA PROLONGACION DE LA CALLE MEJIA, HASTA PASAJE OE11D, BARRIO BALCON COLONIAL"; " READOQUINADO DE LA CALLE EL PLACER DESDE ANDRÉS DE ZÚÑIGA HASTA CALLE BAÑOS, BARRIO EL PLACER, PARROQUIA SAN JUAN" SECTOR SAN JUAN"; "READOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JUAN DE VILLA (DESDE JUAN DE QUIROZ HASTA JERÓNIMO PUENTE), BARRIO TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN"; " ADOQUINADO DE LA CALLE JERÓNIMO PUENTE (PROLONGACIÓN), DESDE JERÓNIMO PUENTE, HASTA RAMÍREZ DE ARELLANO, BARRIO PAVÓN GRIJALVA, PARROQUIA SAN JUAN" El día 07 de marzo de 2023 se realizó la primera inspección, en donde se encontraron algunas observaciones por lo cual el con tratista solicito tres días para subsanarlos por lo que se realizara un nuevo recorrido el viernes 10 de marzo de 2023 a las 14h00 para la nueva inspección.


OBSERVACIONES:

READOQUINADO PASAJE MANUEL J. CALLE, BARRIO LA LOMA GRANDE, SECTOR CENTRO HISTORICO

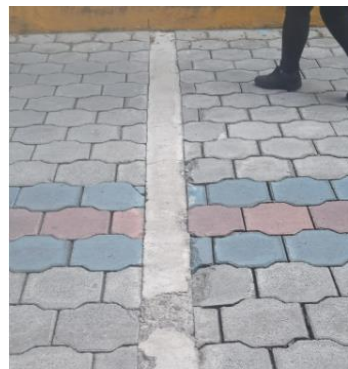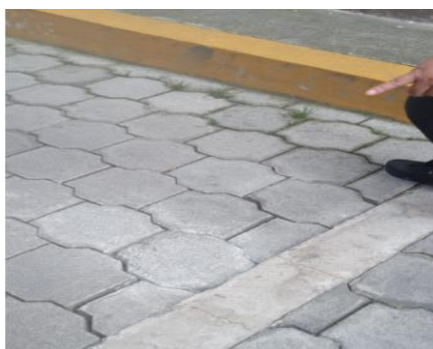



Hay adoquines rotos y una berma esta con fisuras

REHABILITACIÓN DE LA CALLE BARAHONA, BARRIO CENTRO HISTÓRICO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO

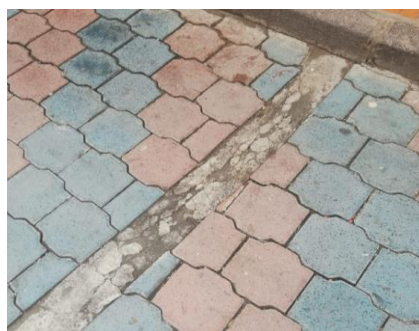


Cambiar adoquín roto, reparación de berma, enlucido rejilla y colocar sumidero

READOQUINADO DE LA PROLONGACION DE LA CALLE MEJIA, HASTA PASAJE OE11D, BARRIO BALCON COLONIAL

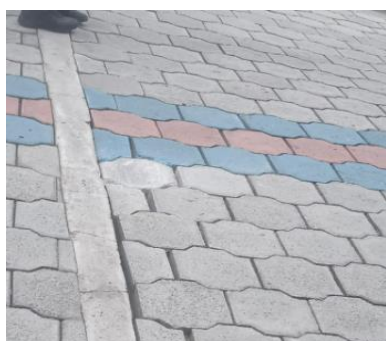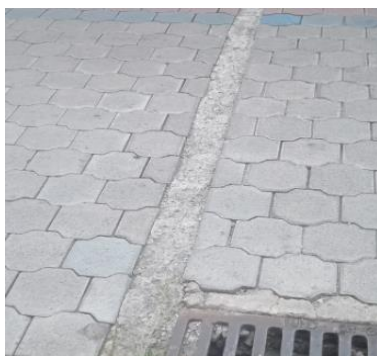

Corregir el espaciamento de los adoquines en la parte central, cambio de adoquines rotos, corregir berma, corregir emporados.

READOQUINADO DE LA CALLE EL PLACER DESDE ANDRÉS DE ZÚÑIGA HASTA CALLE BAÑOS, BARRIO EL PLACER, PARROQUIA SAN JUAN" SECTOR SAN JUAN

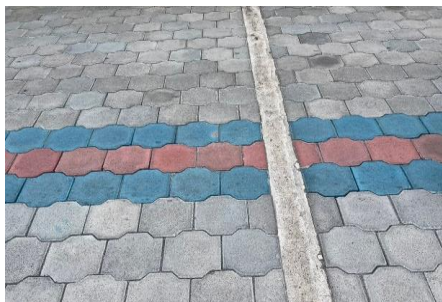

Corregir Hundimientos, retirar el exceso de emporado y reparacion de pozo

READOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JUAN DE VILLA (DESDE JUAN DE QUIROZ HASTA JERÓNIMO PUENTE), BARRIO TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN



Se debe realizar el arreglo de la rejilla y su acometida que se encuentra destruida, cambiar los adoquines rotos, corregir el emporado, reparación de fisura en bermas, corregir espaciamento de adoquín, corregir fisura en los pozos.

DOQUINADO DE LA CALLE JERÓNIMO PUENTE (PROLONGACIÓN), DESDE JERÓNIMO PUENTE, HASTA RAMÍREZ DE ARELLANO, BARRIO PAVÓN GRIJALVA, PARROQUIA SAN JUAN



Se debe corregir la pintura de los bordillos y corregir el emporado de los adoquines.

OBSERVACIONES: Una vez realizada la inspección, se deben subsanar las correcciones antes descritas para programar una próxima inspección dentro de 3 días (10 de marzo de 2023). Se deberá notificar cuando las reparaciones se encuentren subsanadas.

CONTRATISTA
Ing.Erick Aguilar

ADMINISTRADOR DEL PROCESO AZMS
Ing. Cristian Javier Llamuca Llamuca
AZMS

TECNICO NO INTERVINIENTE
Arq. Henry Alba
AZMS

FISCALIZADOR
Ing. Erick García
AZMS



CONSTANCIA DE RECORRIDO E INSPECCIÓN PREVIO A FIRMA AL ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA

MCO-AZC-007-2022

FECHA : Jueves 16 de marzo del 2023

HORA: 10h00

ANTECEDENTES: Mediante documento **GADDMQ-AZMS-DGC-GU-2023-0008-O** de fecha 09 de marzo de 2023, se convoco al primer recorrido al contratista adjudicado del proceso MCO-AZC-007-2022 para la obra: " **5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN SECTORES LA INDEPENDENCIA AMERICA 2 TOCTIUCO Y EUGENIO ESPEJO AZCE.**" " CONSTRUCCIÓN DE MURO, EN LA CIUDADELA EUGENIO ESPEJO, PARROQUIA SAN JUAN " ; " REHABILITACIÓN DEL MURO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA CALLE BUGA HASTA LA CALLE ANTONIO MORGAN, BARRIO LA INDEPENDENCIA, SECTOR SAN JUAN" ; " REHABILITACIÓN DEL PASAJE BUENOS AIRES, DESDE LA CALLE NICARAGUA HASTA EL FINAL DE LA PASAJE BUENOS AIRES, BARRIO AMÉRICA, SECTOR SAN JUAN" ; " REHABILITACIÓN DE LA ESCALINATA NEW YORK, DESDE LA CALLE JOSE RIO FRIO HASTA CALLE BUENOS AIRES, BARRIO AMÉRICA, SECTOR SAN JUAN" ; " REHABILITACION MIRADOR DE TOCTIUCO, DESDE ALVARO DE CEVALLOS HASTA GUATEMALA, BARRIO TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN" El día 16 de marzo de 2023 se realizó la primera inspección, en donde no se encontraron observaciones de forma.


OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE MURO, EN LA CIUDADELA EUGENIO ESPEJO, PARROQUIA SAN JUAN




SIN NOVEDAD

REHABILITACIÓN DEL MURO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA CALLE BUGA HASTA LA CALLE ANTONIO MORGAN, BARRIO LA INDEPENDENCIA, SECTOR SAN JUAN

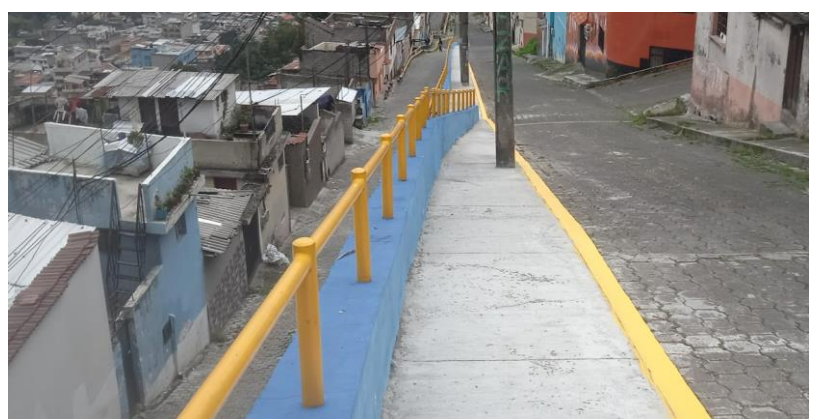

SIN NOVEDAD

REHABILITACIÓN DEL PASAJE BUENOS AIRES, DESDE LA CALLE NICARAGUA HASTA EL FINAL DE LA PASAJE BUENOS AIRES, BARRIO AMÉRICA, SECTOR SAN JUAN

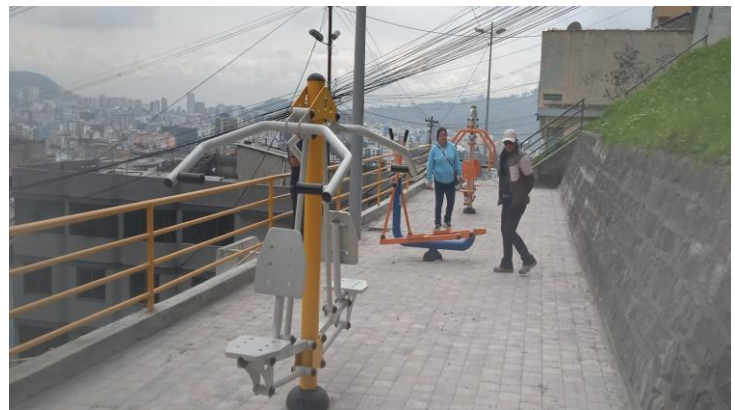

SIN NOVEDAD

REHABILITACIÓN DE LA ESCALINATA NEW YORK, DESDE LA CALLE JOSE RIO FRIO HASTA CALLE BUENOS AIRES, BARRIO AMÉRICA, SECTOR SAN JUAN



SIN NOVEDAD

REHABILITACION MIRADOR DE TOCTIUCO, DESDE ALVARO DE CEVALLOS HASTA GUATEMALA, BARRIO TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN



SIN NOVEDAD

OBSERVACIONES: Sin novedades

CONTRATISTA
Ing. Rosa Cadena

ADMINISTRADOR DEL PROCESO AZMS
Ing. Cristian Llamuca Ll.
AZMS

TECNICO NO INTERVINIENTE
Ing. José García
AZMS

FISCALIZADOR
InG. Erick Garcia
AZMS

FECHA : Jueves 23 de febrero del 2023

HORA : 09H00

CONSTANCIA DE RECORRIDO E INSPECCIÓN PREVIO A LA RECEPCIÓN: PROVISIONAL

MCO-AZC-008-2022 "6 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS PARROQUIA DEL CENTRO HISTORICO SECTORES PANECILLO 3 SAN SEBASTIAN Y LOMA GRANDE 2 AZCE": **55-2022-OP** CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA RAFAEL PASCUALES Y QUIJANO, SECTOR PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO; **51-2022-OP** ARREGLO ACERA CALLE AYMERICH, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTÓRICO; **52-2021-OP** REHABILITACIÓN DE LA ACERA LADO NORTE DE LA CALLE MANUEL VILLAVICENCIO, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTÓRICO; **57-2022-OP** REHABILITACIÓN ESCALINATA Y BOULEVARD DE LA CALLE

UBICACIÓN: PARROQUIA CENTRO HISTORICO

OBSERVACIONES:

*** 55-2022-OP CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA RAFAEL PASCUALES Y QUIJANO, SECTOR PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO**

Resane puntual de muro (Parte superior central)

*** 51-2022-OP ARREGLO ACERA CALLE AYMERICH, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTÓRICO**

Sin novedad

*** 52-2022-OP REHABILITACIÓN DE LA ACERA LADO NORTE DE LA CALLE MANUEL VILLAVICENCIO, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTÓRICO**

Resane perforaciones

*** 57-2022-OP REHABILITACIÓN ESCALINATA Y BOULEVARD DE LA CALLE BENIGNO VELA, BARRIO SAN SEBASTIÁN, SECTOR CENTRO HISTÓRICO**

Limpieza detramo inicial de contrahuellas y pasamanos (mortero) y resane de 2 columnetas de mirador superior

*** 58-2022-OP COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN MURO DE LA CALLE MALDONADO, BARRIO SAN SEBASTIÁN, LOMA GRANDE, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO**

Sin novedad

*** 59-2022-OP REHABILITACIÓN ACERAS NORTE Y SUR PROLONGACIÓN AV. SUCRE, DESDE ROCAFUERTE HASTA FINAL DE LA LIGA SAN SEBASTIÁN, BARRIO LA LOMA GRANDE, SECTOR CENTRO HISTÓRICO**

Pintura de bordillos

SE EJECUTARAN LA OBSERVACIONES EN UN PLAZO DE :

8 días (viernes 3 de marzo)

CONTRATISTA

Ing. Córdor Haro Jenny Alexandra

FISCALIZADOR

Ing. Erick Felipe García Román

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Arq. María Fernanda Larrea

JEFE DE FISCALIZACIÓN

Arq. María de los Angeles Elizalde

DELEGADO

Arq. Henry Alba

NO PARTICIPO EN OBRAS

CONSTANCIA DE RECORRIDO E INSPECCIÓN PREVIO A FIRMA AL ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL

MCO-AZC-009-2022

FECHA : Jueves 23 de marzo del 2023

HORA: 10h00

ANTECEDENTES: Mediante documento **AZMS-DAF-SAC-2023-0583-E** de fecha 13 de marzo de 2023, la contratista adjudicada del proceso MCO-AZC-009-2022 para la obra: " **READOQUINADO DE LA CALLE GUATEMALA DESDE LA CALLE BENALCAZAR HASTA LA CALLE BOMBONA, BARRIO SAN JUAN PARROQUIA SAN JUAN.**" solicita se realice la Recepción Definitiva de Obra. Se realizó la primera inspección, misma que posee observaciones, por lo que se procede a realizar un segundo recorrido de la Obra.

OBSERVACIONES:

READOQUINADO DE LA CALLE GUATEMALA DESDE LA CALLE BENALCAZAR HASTA LA CALLE BOMBONA, BARRIO SAN JUAN PARROQUIA SAN JUAN



Falta emporado de varias áreas; la separación entre adoquines supera lo máximo tolerable, hay adoquines levantados en especial cerca de las bermas, hay adoquines sueltos, no existe uniformidad en la colocación de los adoquines, existe una rejilla que no está fija y una berma con fisuras

OBSERVACIONES: Las irregularidades mayores a las tolerancias admitidas deberán ser corregidas, levantando los adoquines en la sección afectada, nivelando la capa de asiento o cambiando los adoquines. El presente documento será legalizado con la suscripción de las firmas pertinentes que, para constancia de lo actuado, se instrumentará con firmas electrónicas.

CONTRATISTA
Ing. Jenny Córdor

ADMINISTRADOR DEL PROCESO AZMS
Ing. Cristian Javier Llamuca
AZMS

TECNICO NO INTERVINIENTE
Ing. José García
AZMS

OBSERVADOR
Arq. María de los Ángeles Elizalde
JEFA DE FISCALIZACIÓN
AZMS

CONSTANCIA DE RECORRIDO E INSPECCIÓN PREVIO A FIRMA AL ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA

MCO-AZC-009-2022

FECHA : Jueves 30 de marzo del 2023

HORA: 11h00

ANTECEDENTES: Mediante documento **AZMS-DAF-SAC-2023-0583-E** de fecha 13 de marzo de 2023, el contratista adjudicado del proceso MCO-AZC-009-2022 para la obra: " **READOQUINADO DE LA CALLE GUATEMALA DESDE LA CALLE BENALCAZAR HASTA LA CALLE BOMBONA, BARRIO SAN JUAN PARROQUIA SAN JUAN.**" solicita se realice la Recepción definitiva de la Obra. Se realizó la segunda inspección, misma que no posee observaciones, por lo que se procede a Recibir Definitivamente la Obra.

OBSERVACIONES:

READOQUINADO DE LA CALLE GUATEMALA DESDE LA CALLE BENALCAZAR HASTA LA CALLE BOMBONA, BARRIO SAN JUAN PARROQUIA SAN JUAN



SIN NOVEDAD

OBSERVACIONES: El presente documento será legalizado con la suscripción de las firmas pertinentes que, para constancia de lo actuado, se instrumentará con firmas electrónicas.

CONTRATISTA
Ing. Jenny Córdor

ADMINISTRADOR DEL PROCESO AZMS
Ing. Cristian Javier Llamuca
AZMS

TECNICO NO INTERVINIENTE
Ing. José García
AZMS

OBSERVADORA
Arq. María de los Ángeles Elizalde
JEFA DE FISCALIZACIÓN
AZMS
